СОГЛАСОВАНО

Директор ООО "РМК"

_____ / Е.В. Циклаури

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Жилой комплекс "Березовая роща"

_____ / А.И. Перевозчиков

График Строительно-монтажных работ

Объект: "Многоквартирный жилой дом по ул. Сокольской, 123 в Кировском районе г. Перми"
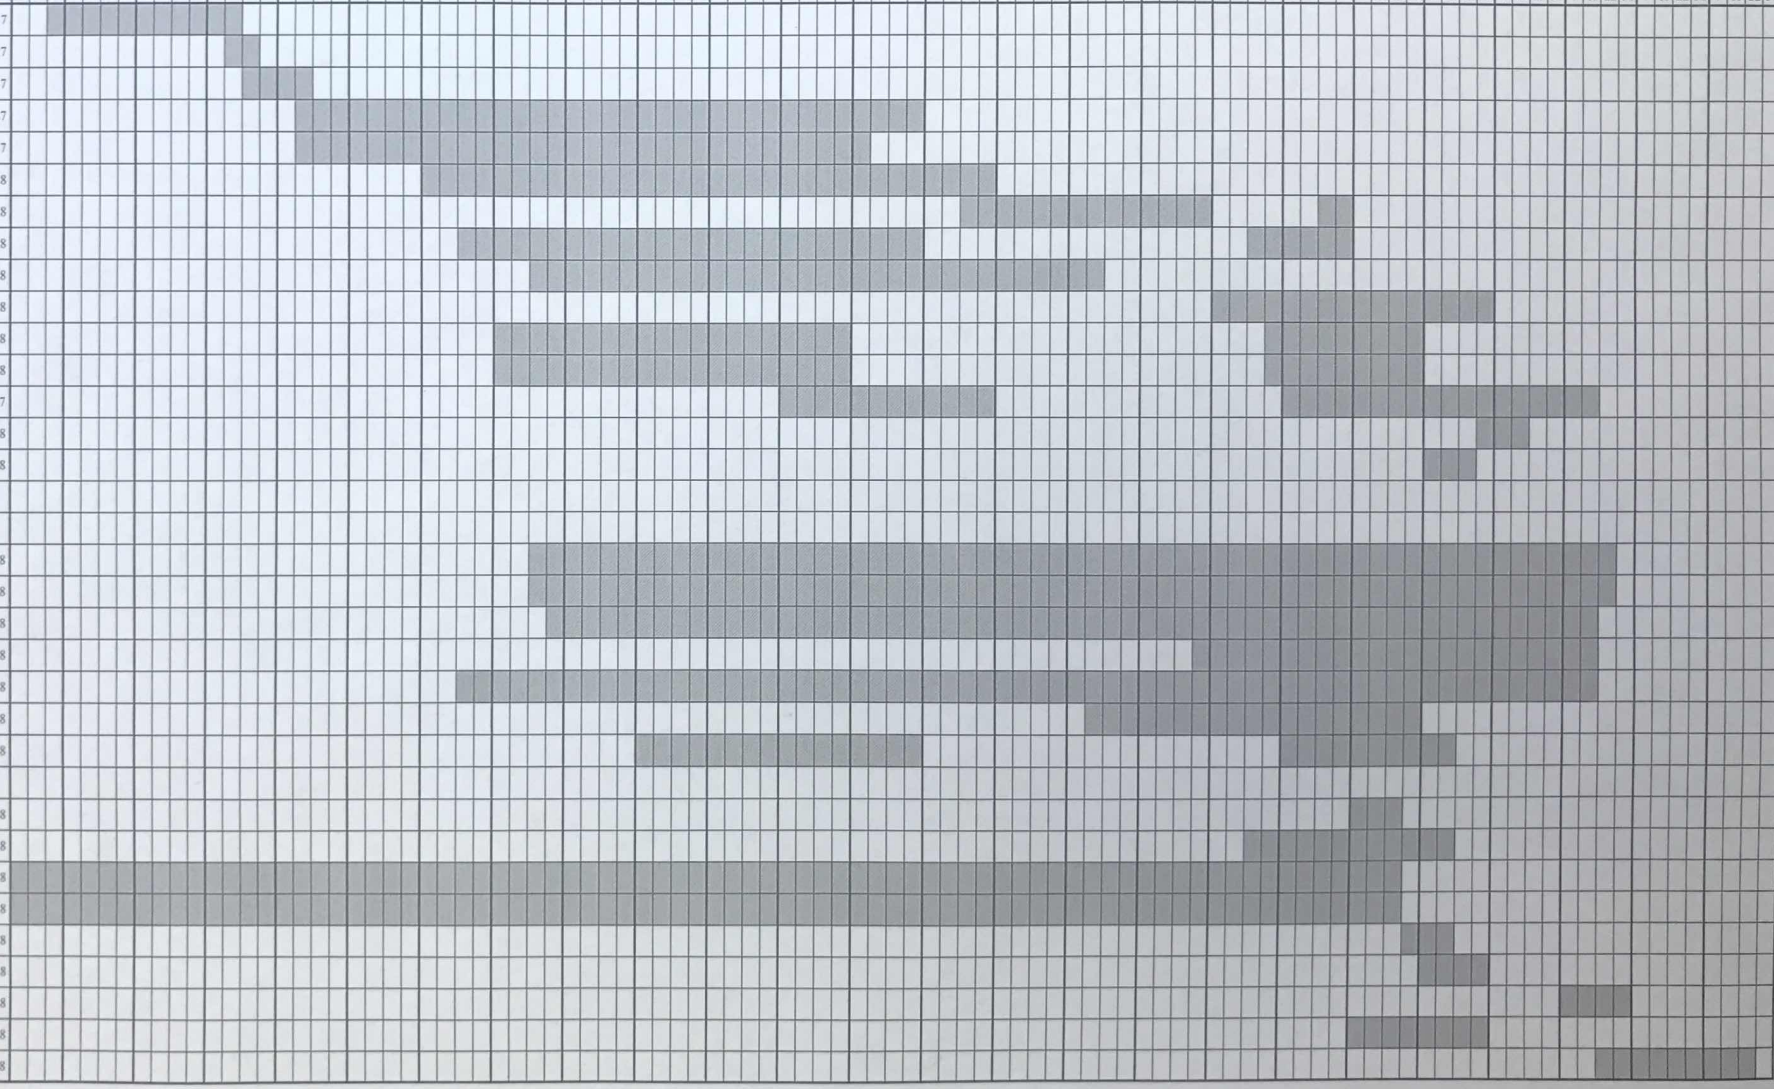
№	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
1	Подготовка строительной площадки, временные коммуникации	39 дней	24.12.16	13.03.17
2	Разработка котлована	5 дней	15.03.17	19.03.17
3	Устройство фундаментной плиты	24 дней	19.03.17	14.04.17
4	Работа башенного крана	284 дней	10.04.17	30.12.17
5	Каркас здания	257 дней	13.04.17	07.12.17
6	Слоистая кладка наружных стен	243 дней	01.06.17	31.01.18
7	Устройство кровли	150 дней	22.01.18	31.06.18
8	Устройство внутренних стен и перегородок	365 дней	16.06.17	31.06.18
9	Устройство оконный и балконных блоков	239 дней	17.07.17	10.03.18
10	Остекление балконов, витражей	121 дней	01.05.18	31.08.18
11	Устройство черновой отделки	360 дней	01.09.17	30.07.18
12	Устройство цементно-песчанной стяжки полов	365 дней	01.07.17	30.07.18
13	Устройство чистовой отделки	239 дней	01.11.17	20.10.17
14	Установка наружных дверей	7 дней	29.08.18	04.09.18
15	Устройство входных групп	20 дней	01.08.18	20.08.18
16	**Инженерные сети**			
17	***Внутренние сети***			
18	Система электроснабжения	456 дней	17.07.17	15.10.18
19	Система водоснабжения и канализации	453 дней	17.07.17	12.10.18
20	Система отопления	442 дней	24.07.17	08.10.18
21	Система ПС	169 дней	24.04.18	08.10.18
22	Система вентиляции	480 дней	11.06.17	08.10.18
23	Монтаж лифтов	140 дней	15.03.18	30.07.18
24	Системы связи	340 дней	07.09.17	10.08.18
25	***Наружные сети***			
26	Молниезащита и заземление	20 дней	01.07.18	20.07.18
27	Система электроснабжения	79 дней	16.05.18	03.08.18
28	Система водоснабжения и канализации	79 дней	01.12.16	30.06.18
29	Тепловые сети	79 дней	01.12.16	30.06.18
30	Системы связи	7 дней	26.07.18	01.08.18
31	Освещение	30 дней	01.08.18	30.08.18
32	Пусконаладочные работы оборудования всех инженерных систем	30 дней	01.10.18	30.10.18
33	Благоустройство территории	30 дней	01.07.18	30.08.18
34	Сдача объекта	64 дней	10.10.18	22.12.18
